

Seis fases, del research al desarrollo

Planteamiento a máximos. Cada fase puede comprimirse en un enfoque MVP según plazos y presupuesto.

01

Discovery y research

Sem. 1–4

- Kick-off con negocio, marketing, call center y legal
- Auditoría de analítica, embudo y formularios
- Evaluación heurística y de accesibilidad
- Benchmark: aseguradoras, neobancos, roboadvisors
- Entrevistas a médicos de ambos segmentos y encuesta
- Dudas reales del call center

ENTREGABLE
Informe de insights y oportunidades

02

Definición y estrategia

Sem. 4–7

- Proto-personas y customer journey por momento vital
- Propuesta de valor y posicionamiento
- Arquitectura de información: card sorting y tree testing
- KPIs y plan de medición
- Roadmap y alcance del MVP (MoSCoW)

ENTREGABLE
Estrategia, sitemap y roadmap

03

Ideación y diseño UX

Sem. 7–11

- User flows: recomendador, simulador y captación de lead
- Wireframes lo-fi → mid-fi
- UX writing en lenguaje claro y glosario
- Prototipo navegable
- 2 rondas de test de usabilidad (6–8 médicos) e iteración

ENTREGABLE
Prototipo validado con usuarios

04

Diseño UI y design system

Sem. 10–14

- Evolución de marca: moodboard y style tiles
- Design system en Figma: tokens, componentes y estados
- Diseño hi-fi desktop y mobile
- Accesibilidad AA: contraste, foco, tamaños
- Preference test y handoff (Dev Mode, specs)

ENTREGABLE
UI final + librería de componentes

05

Desarrollo y QA

Sem. 13–20

- Sprints de 2 semanas con diseño en el equipo
- Componentes en el CMS actual (Liferay)
- Leads integrados con CRM y call center
- Etiquetado de eventos (GA4) y SEO
- QA funcional, accesibilidad, rendimiento y RGPD

ENTREGABLE
Portal en producción

06


Lanzamiento y optimización

Sem. 21+

- Lanzamiento progresivo y monitorización
- Dashboard de conversión por etapa
- A/B tests: hero, CTAs y formularios
- Heatmaps y feedback del call center
- Evolutivos: área personal, contratación online

ENTREGABLE
Mejora continua (CRO)

Planificación, equipo y cómo medimos el éxito

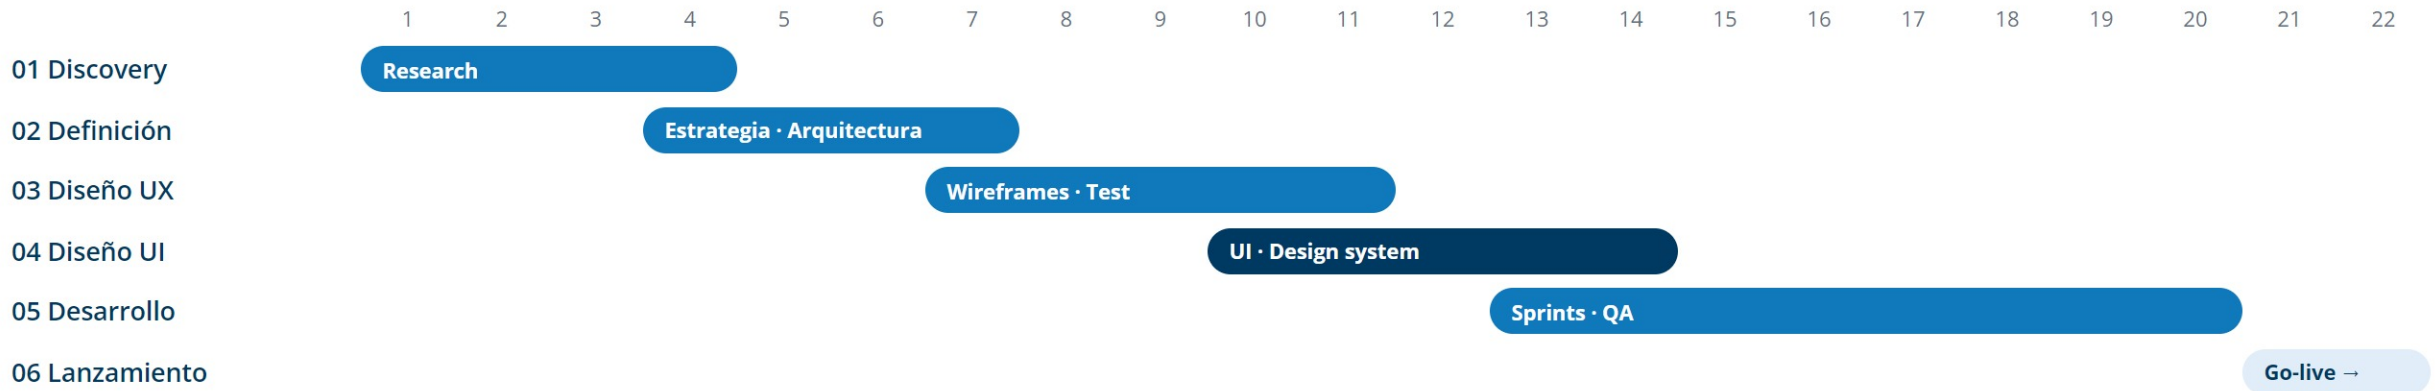

Cómo trabajamos

- Double Diamond para el diseño + Scrum para el desarrollo
- Validación con médicos reales en cada fase
- Diseño y desarrollo solapados para ganar tiempo
- Revisión legal y de compliance continua

Equipo

- Product Owner (Mutual Médica) y Project Manager
- UX Researcher · Senior UX/UI Designer · UX Writer
- Front-end, back-end y QA
- Analista de datos / CRO y SEO

KPIs de éxito

↑ Leads

Tasa de conversión a solicitud de llamada

↑ Contratación

Ratio lead → póliza firmada por teléfono

↑ 30-40 años

Peso del nuevo target en el tráfico y en los leads

↑ Capacitación

Uso del simulador, el recomendador y el glosario
